



## Conservación Callejones El Manzanal, Quiriquiño y Manuel Peñailillo, Comuna de Yervas Buenas

Septiembre 2026

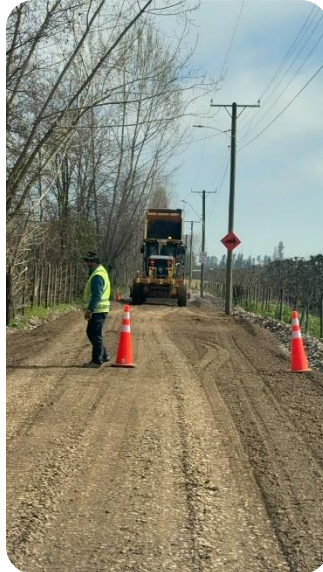

### Avance General del Proyecto



Avances de la obra (01 al 11 de septiembre)



Sector (es) intervenido (s):

- Callejón Quiriquiño, Callejón Manzanal y Callejón Manuel Peñailillo.



Trabajos ejecutados:

Durante estas semanas se continuó avanzando en la preparación y mejoramiento de los caminos, realizando trabajos que permitirán avanzar hacia las siguientes etapas de la obra.

- **Callejón Manuel Peñailillo:**

Se completó en un 100 % la formación y compactación del terreno, trabajos que permiten nivelar el camino y darle la altura necesaria para su correcta construcción.

Con esto, se completó también en un 100 % la preparación de la superficie del camino, dejándola nivelada y en las condiciones necesarias para recibir la siguiente

capa de material. Además, se perfiló el camino, dejándolo a la altura definida para continuar con la incorporación de material granular y permitiendo el tránsito en el sector.

- **Callejones Quiriquiño y El Manzanal:**

Se completó en un 100 % la excavación, la instalación de alcantarillas de HDPE y el relleno estructural de estas, permitiendo mejorar el paso y evacuación de las aguas bajo los caminos.

Actualmente, ambos callejones presentan un 80 % de avance en la colocación de la base granular, material que forma parte de la estructura del camino y que permite generar una superficie firme y estable antes de realizar la pavimentación.



### **Próximos trabajos:**

**Durante las próximas semanas se continuará avanzando en las distintas etapas de construcción.**

- **Callejón El Manzanal**

Se finalizará la preparación y compactación de la base granular, dejando la superficie lista para iniciar la pavimentación del camino.

- **Callejón Quiriquiño**

Se continuará con la colocación y compactación de la base granular. Una vez finalizados estos trabajos, se preparará y sellará la superficie para posteriormente comenzar con la pavimentación del camino.

- **Callejón Manuel Peñailillo**

Se continuará con la preparación del camino para las siguientes etapas de construcción. Se incorporará base granular y se realizarán trabajos para mejorar el paso de las aguas, incluyendo la modificación de los atravesos existentes y la instalación de cajones prefabricados de hormigón.

**¿SABÍAS  
QUÉ?**

Un camino no se construye solamente colocando material en la superficie. **Cada capa cumple una función para soportar el tránsito y mantener su estabilidad.**

Esta obra es financiada y ejecutada por el Gobierno Regional del Maule para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas.
