


Construcción Pavimentación Vías Población El Esfuerzo,
Comuna de Yerbabuenas

Septiembre 2026



Avance General del Proyecto: 39,69%

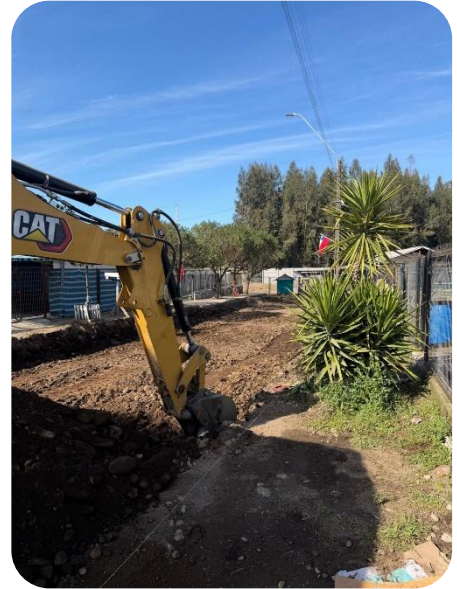

Avances de la obra (07 al 17 de septiembre)



Sector (es) Intervenido (s):

- **Todas las calles del proyecto:** se completó el retiro de la capa superficial del terreno, como parte de la preparación para la pavimentación.
- **Calle La Sede:** se completaron las principales etapas de preparación y construcción de la calzada, incluyendo instalación de soleras y hormigón. **Solo quedan pendientes algunos accesos o conexiones de la calzada.**
- **Calle Luis Salas Neira:** se avanzó desde la preparación del terreno hasta la instalación de soleras y hormigón de calzada, quedando pendientes algunos accesos o conexiones.
- **Calle Carlos González A.:** se completaron las principales etapas de preparación, instalación de soleras y hormigonado, quedando pendientes algunos accesos o conexiones.

- **Calle Luis Gutiérrez Parada:** se avanzó en la preparación del terreno, instalación de soleras y **hormigón de calzada en el tramo entre las calles Gabriel Oses Martínez y José Manuel Gutiérrez.**
- **Calle Maximiliano Calderón:** se realizó la preparación del terreno y se avanzó en el trazado e instalación de **tuberías para aguas lluvias.**
- **Zanja de infiltración:** trabajo **completado al 100%**, contribuyendo al manejo de las aguas lluvias del sector.



Trabajos Ejecutados:

- Escarpe: **Avance de Obra 100%**
- Preparación de la Subrasante: **Avance de Obra 53,46%**
- Excavaciones: **Avance de Obra 68%**
- Suministro y Colocación de Base Estabilizada de Calzada: **Avance de Obra 53,81 %**
- Suministro y Colocación de Solera Tipo A: **Avance de Obra 54,06%**
- Suministro e Instalación de Hormigón de Calzada: **Avance de Obra 33,29%**
- Extracción de Árboles: **Avance de Obra 68,97%**



Próximos Trabajos:

Durante la próxima semana, las obras continuarán avanzando en distintos sectores del proyecto:

- **Calle Nicanor Cofré Chaparro:** se iniciará la preparación del terreno, incluyendo trazado y excavaciones.
- **Calle Luis Gutiérrez Parada:** continuarán los trabajos de preparación de la calzada, instalación de base y soleras, y **hormigonado de la calle.**
- **Calle Maximiliano Calderón:** continuarán los trabajos del **sistema de aguas lluvias**, junto con la instalación de soleras y base para la futura calzada.

¿SABÍAS QUÉ?

Las zanjas de infiltración permiten que el agua de lluvia pueda infiltrarse en el terreno, ayudando a disminuir la acumulación de agua en la superficie.

Esta obra es financiada y ejecutada por el Gobierno Regional del Maule para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas.
