
GOBIERNO DEL MAULE
— CONSTRUYE —

Construcción Pavimentación Vías Población El Esfuerzo, Comuna de Yerbas Buenas

Octubre 2026



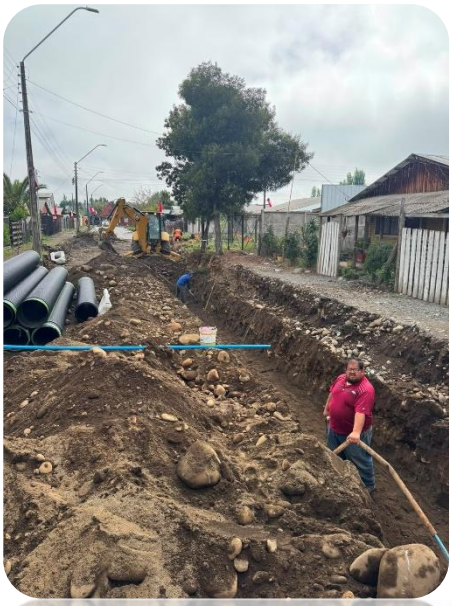

Avance General del Proyecto: 47,68%

Avances de la obra (21 de septiembre al 02 de octubre)

Sector (es) Intervenido (s):

- **Todas las calles:** se completó el retiro de la capa superficial del terreno, como parte de la preparación para la pavimentación.
- **Calle La Sede:** se completaron las principales etapas de construcción de la calzada, incluyendo preparación del terreno, base, soleras y hormigón. Quedan pendientes algunos accesos a las viviendas.
- **Calle Luis Salas Neira:** además de los trabajos de la calzada, se avanzó en la excavación y preparación de las futuras veredas, incluyendo la colocación de su base.
- **Calle Carlos González A.:** se completaron las principales etapas de construcción de la calzada, quedando pendientes algunos accesos a las viviendas.

GOBIERNO DEL MAULE
¡Se vive mejor!

- **Calle Luis Gutiérrez Parada:** se avanzó en la construcción de la calzada en el tramo comprendido entre Gabriel Oses Martínez y José Manuel Gutiérrez.
- Calle Maximiliano Calderón: se avanzó en la preparación de la calle y en la instalación de tuberías para aguas lluvias.
- **Zanja de infiltración:** se encuentra 100% ejecutada.
- **Calle Gabriel Oses Martínez:** se avanzó en la construcción de la calzada y en el sistema de aguas lluvias, incluyendo la instalación de tubería, soleras, base y hormigón en media calzada.
- **Calle Nicanor Cofré Chaparro:** se iniciaron los trabajos de trazado y excavación de la calzada.

Trabajos Ejecutados:

- Escarpe: **Avance de Obra 100%**
- Preparación de la Subrasante: **Avance de Obra 58,44%**
- Excavaciones: **Avance de Obra 74,4%**
- Suministro y Colocación de Base Estabilizada de Calzada: **Avance de Obra 62,65 %**
- Suministro y Colocación de Solera Tipo A: **Avance de Obra 64,34%**
- Suministro e Instalación de Hormigón de Calzada: **Avance de Obra 39,45%**
- Extracción de Árboles: **Avance de Obra 71,24%**
- Colector de aguas lluvias Tubería de 450 mm**: Avance de Obra 34%**
- Colector de aguas lluvias Tubería de 375 mm: **Avance de Obra 29%**





GOBIERNO DEL MAULE
— CONSTRUYE —

Próximos Trabajos:

Durante la próxima semana, las obras continuarán avanzando en distintos sectores del proyecto:

- **Calle Nicanor Cofré Chaparro:** se realizarán excavaciones para instalar las tuberías del sistema de aguas lluvias.
- **Calle Luis Gutiérrez Parada:** se continuará con la instalación de tuberías para aguas lluvias, soleras y base para la calzada, además del hormigonado de los tramos pendientes.
- **Calle Maximiliano Calderón:** se instalarán soleras y se colocará la base de la calzada en el primer sector.
- **Calle Gabriel Oses Martínez:** se completará la instalación de soleras, la colocación de base y el hormigonado de la calzada pendiente.

¿SABÍAS QUÉ?

El hormigón utilizado en las calzadas debe cumplir condiciones técnicas que permitan soportar el tránsito y las condiciones propias del sector.

